

**Planificación orientada a hitos y objetivos, así como los criterios para su seguimiento y acreditación del resultado (Anexo III.A Orden HFP/1030/2021).
Sistema de información CoFFEE MRR**

Principios de gestión específicos del PRTR



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



GOBIERNO
DE ESPAÑA



Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia



GENERALITAT
VALENCIANA

GVANEXT

Fons Next Generation
a la Comunitat Valenciana




En la sesión de hoy...

1. Planificación orientada a hitos y objetivos
2. Criterios para su seguimiento y acreditación del resultado (Anexo III.A Orden HFP/1030/2021)
3. Sistema de información CoFFEE

1. Planificación orientada a hitos y objetivos


Principios y criterios de gestión

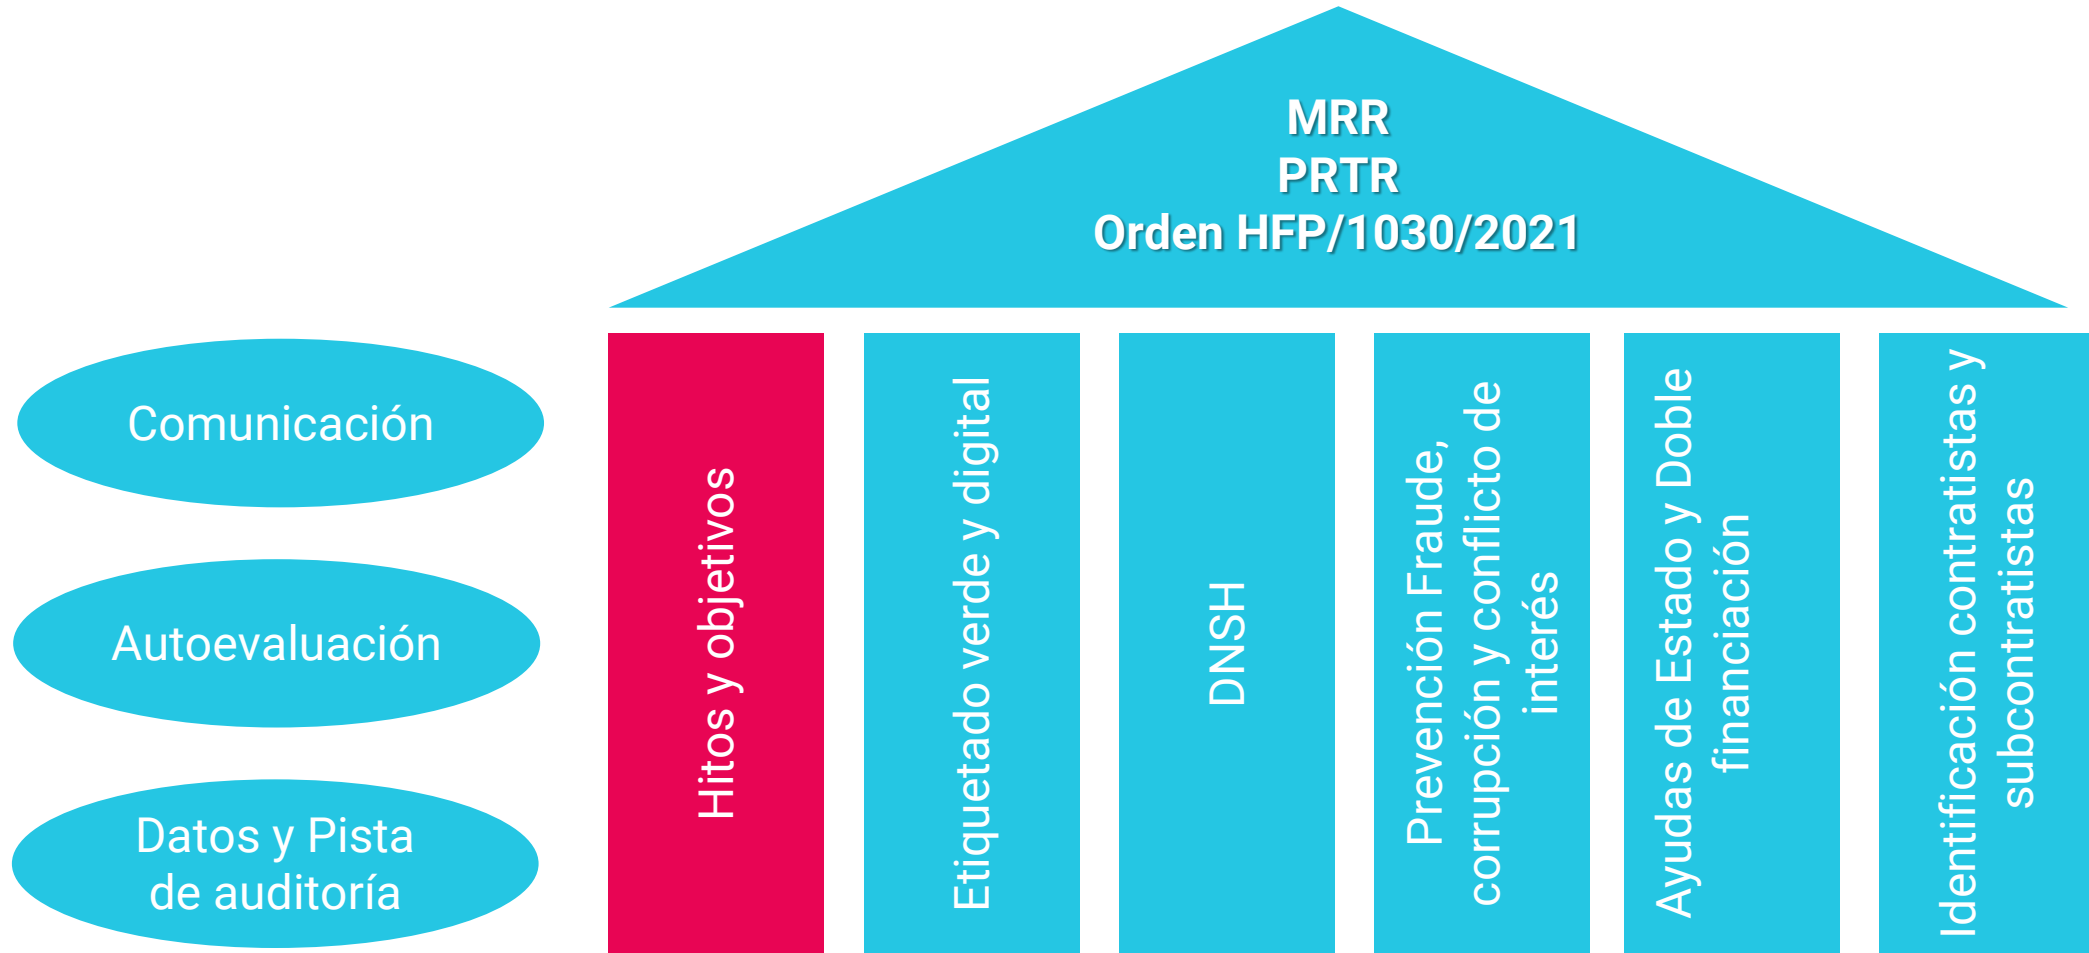

Ciclo de gestión de un proyecto



Fases de gestión de un proyecto – PRTR/MRR

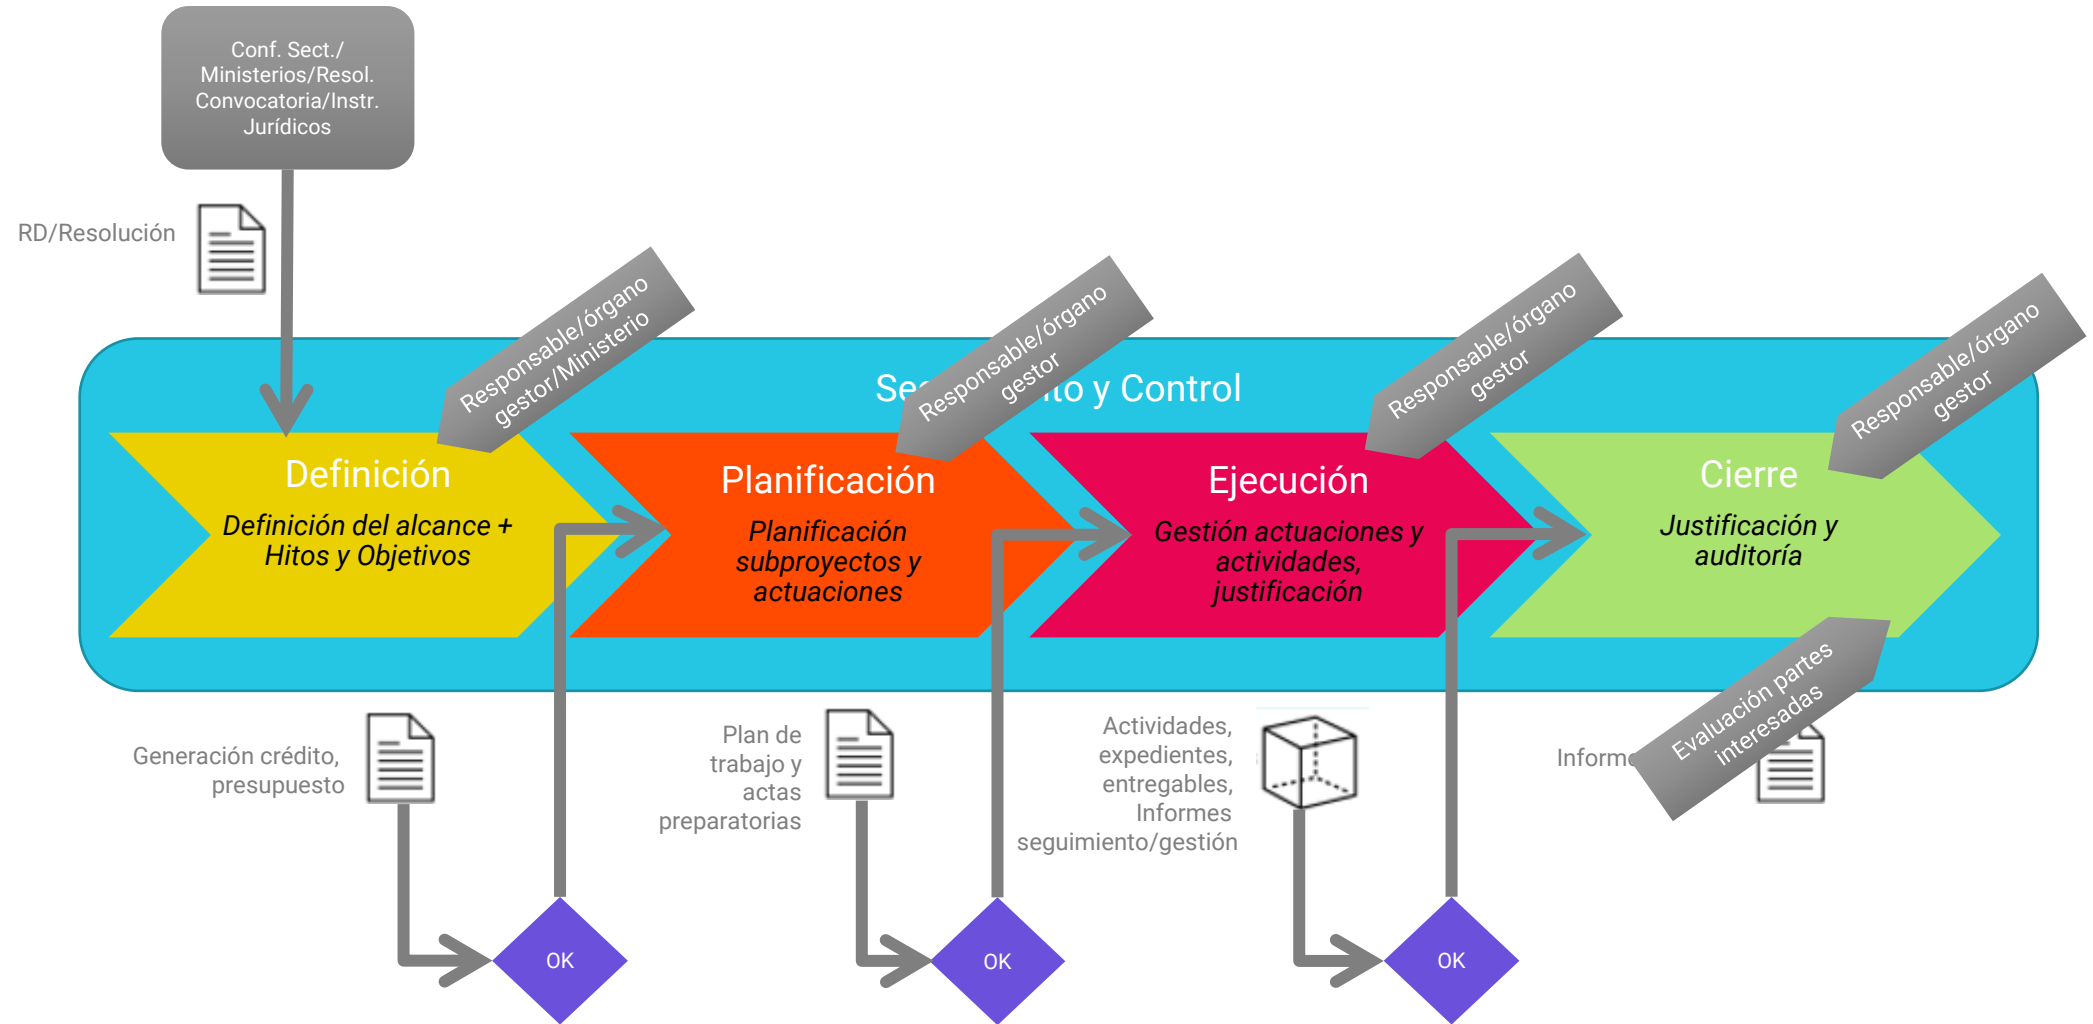

Hitos y Objetivos

Hitos y Objetivos CID: en función de cuya consecución se desembolsan los fondos del MRR. Forman parte de la Decisión de Ejecución del Consejo o Council Implementing Decision (CID). Cada HyO CID se asocia a una única Medida.

Hitos y Objetivos OA: se definen para monitorizar los HyO CID. Son los “Monitoring Indicators” que se incluyen en las Disposiciones Operativas u Operational Arrangements (OA). Cada HyO OA se asocia a una única Medida.

Hitos y Objetivos de Gestión: HyO para la gestión y seguimiento interno (Entidades decisoras, Entidades ejecutoras, Autoridad de control y Autoridad responsable). Se asocian a Proyectos, Subproyectos o Líneas de acción. Cada uno de estos elementos de la estructura tiene uno o más HyO de Gestión. No forman parte ni del CID ni del OA. Pueden ser críticos o no críticos.

Hitos y Objetivos de Gestión

Críticos: HyO de gestión de Proyectos o Subproyectos o de sus Líneas de acción cuya consecución es imprescindible para el cumplimiento de los HyO CID y para los que las fechas de cumplimiento han sido establecidas teniendo en cuenta los compromisos a cumplir para poder tramitar una solicitud de pago. Todo HyO CID tiene al menos asignado un HyO crítico.

No críticos: HyO de gestión de Proyectos o Subproyectos o de sus líneas de acción para la gestión y seguimiento. Su eventual incumplimiento (meta o fecha de consecución) no supone el incumplimiento directo de HyO CID. Sus funciones son:

- (1) gestionar riesgos incumplimiento de HyO CID (adopción de acciones preventivas o correctivas),
- (2) agregar la información para alimentar los Indicadores OA (el grado de consecución de cada Indicador OA de una Medida es el resultado directo de las mediciones de uno o varios Indicadores de los HyO No Críticos de los Proyectos y Subproyectos que integran dicha Medida) y
- (3) cubrir el seguimiento de acciones contempladas en las Medidas que no forman parte de los HyO CID.

En la **herramienta informática**, la expresión **“No críticos”** se reserva para los HyO que cumplen la función (2), mientras que los que cumplen las funciones (1) y (3) se denominan hitos **“Auxiliares”**.

- Los hitos “Auxiliares” que cumplen la función (1) se establecen en cada ciclo de planificación anual del Proyecto o Subproyecto y se denominan hitos “Auxiliares de Planificación”.
- Los hitos “Auxiliares” que cumplen la función (3) se establecen en la fase de definición del Proyecto con el que se implementarán las acciones referidas a esa función y se denominan hitos “Auxiliares de Definición”.


2. Criterios para su seguimiento y acreditación del resultado

(Anexo III.A Orden HFP/1030/2021)



Sistema de gestión del PRTR


- ❑ Permite **definir, planificar, ejecutar, seguir y controlar** los proyectos/subproyectos en los que se descomponen las medidas (reformas e inversiones) previstas en los Componentes.
- ❑ Orientado a resultados: **cumplimiento de H/O**

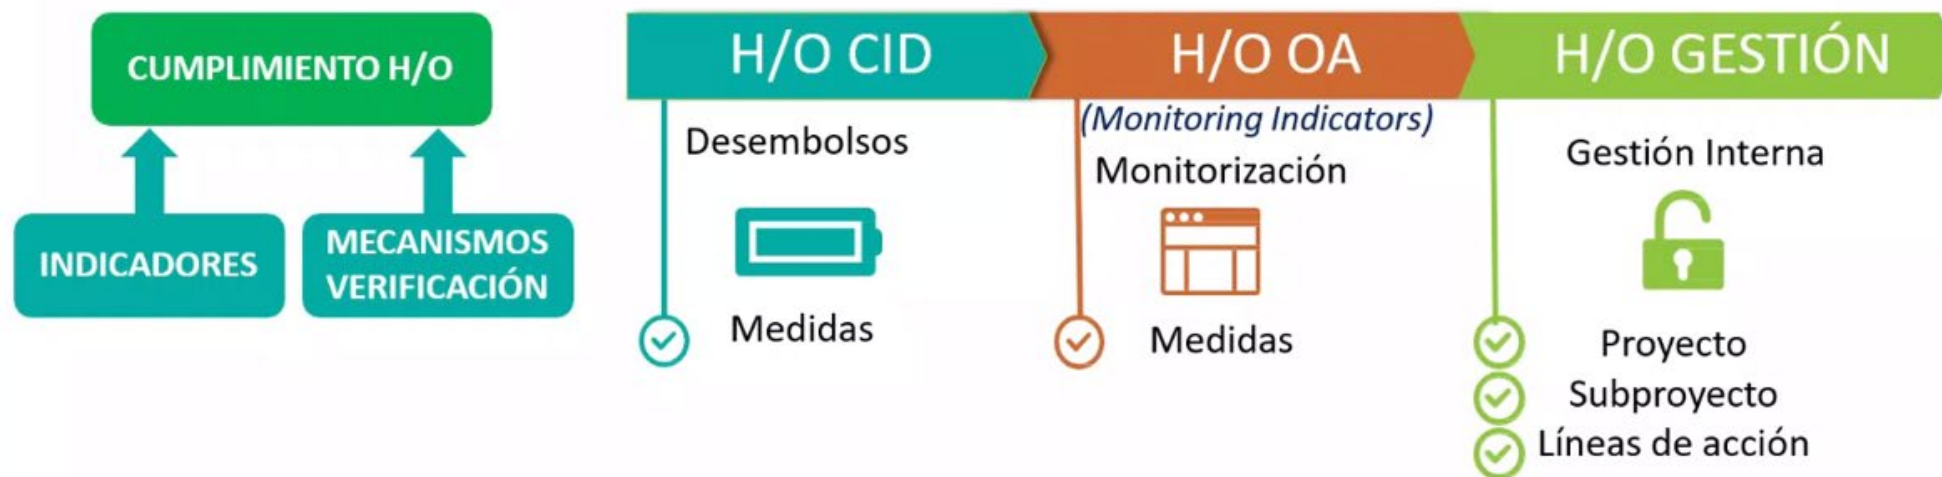

Metodología de gestión de hitos y objetivos PRTR

- ❑ Gestionar y controlar el cumplimiento del PRTR.
- ❑ Cada medida del PRTR dispone de indicadores para medir el avance en la ejecución de una reforma o de una inversión.


The screenshot shows a website header with logos for the European Union, the Spanish Government, and the Valencian Government. The main content area features a breadcrumb trail: "CAU SG DE FONDOS EUROPEOS > Documentos para la gestión > Documentos CoFFEE-MRR (Plataforma Común de FFEE -Fondos Europeos)". A search bar is visible on the right. Below the breadcrumb, there is a section titled "Artículos en esta sección" with a link to "Metodología de Gestión de Hitos y Objetivos del PRTR (Actualización 06/02/2023)".

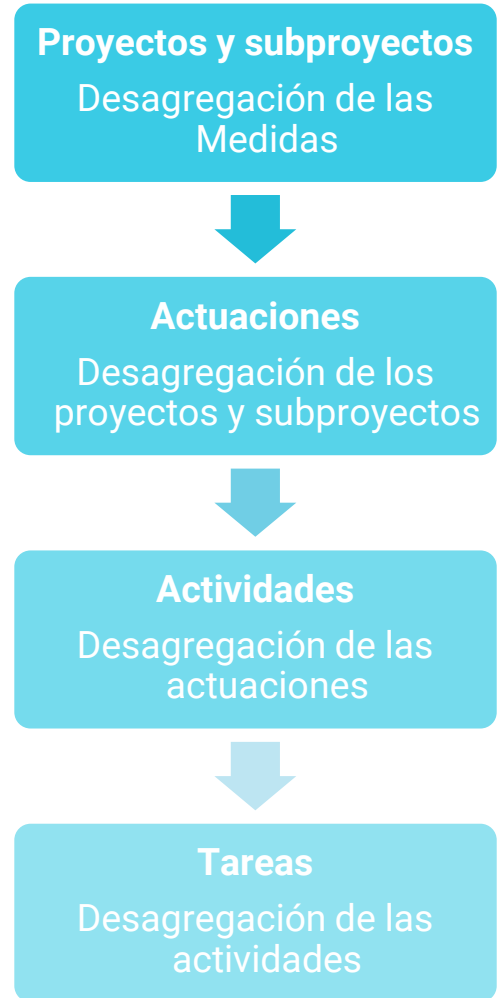

Reparto de obligaciones de cumplimiento H/O

- ❑ Los H/O se deben cumplir a nivel MEDIDA
- ❑ Al desagregar las medidas se “reparten” los H/O
- ❑ La suma de los logros debe garantizar el cumplimiento a nivel medida.

Reparto H/O



Acreditación H/O

Seguimiento de resultados

- ✓ Los Hitos y Objetivos son los resultados que, en un plazo concreto de tiempo, nos comprometemos a alcanzar con el desarrollo de las reformas e inversiones del PRTR.



Hito

- Logro cualitativo
- Aprobar una Ley



Objetivo

- Logro cuantitativo
- N° proyectos finalizados



Indicador

- Medir el grado de cumplimiento del valor "meta".
- N° edificios reformados



Mecanismo verificación

- Prueba de cumplimiento
- Evidencias documentales

Anexo III.A Orden HFP/1030/2021

Referencia gestión de hitos y objetivos

- **6 cuestionarios:**
 - Definición de proyectos y subproyectos
 - Planificación anual de proyectos y subproyectos
 - Ejecución de líneas de acción
 - Ejecución de Subproyectos (HyO críticos y no críticos)
 - Ejecución de Proyectos (HyO críticos y no críticos)
 - Ejecución de Medidas (HyO CID y OA)

ANEXO III

Referencias principios y criterios de gestión

Índice



- A. Gestión de hitos y objetivos.
- B. Análisis de riesgo sobre impactos medioambientales no deseados (DNSH).
- C. Conflicto de interés, prevención de fraude y corrupción.
- D. Régimen de ayudas de Estado y evitar la doble financiación.


Cuestionario: Gestión de hitos y objetivos. Definición de Proyectos y Subproyectos

Responsable: Entidad ejecutora (Órgano gestor)

Definición de proyectos y subproyectos		Sí	No	No aplica	Comentarios
1	¿La Entidad ejecutora de cada Proyecto/Subproyecto ha sido identificada? (la Entidad ejecutora del Proyecto puede coincidir con la Entidad decisora de la Medida en que se integra).				
2	¿El Órgano gestor de cada Proyecto/Subproyecto ha sido identificado? (si la Entidad ejecutora es la Entidad decisora de la Medida, el Órgano gestor del Proyecto puede coincidir con el Órgano responsable de la Medida).				
3	¿Se han identificado los usuarios que tendrán acceso a la información del Proyecto/Subproyecto en la herramienta informática y con qué roles (permisos)?				
4	¿Los hitos y objetivos Críticos de los Proyectos definidos cubren todo el espectro de los hitos y objetivos CID de la Medida?				
5	¿Los hitos y objetivos No Críticos de los Proyectos definidos cubren todo el espectro de los hitos y objetivos OA de la Medida?				
6	¿Todo hito u objetivo Crítico de Proyecto está vinculado a un hito u objetivo CID?				
7	¿Los hitos y objetivos Críticos del Subproyecto están vinculados al correspondiente hito u objetivo Crítico del Proyecto o Subproyecto en el que se integran?				
8	¿Los hitos y objetivos No Críticos del Subproyecto están vinculados al correspondiente hito u objetivo No Crítico del Proyecto o Subproyecto en el que se integran?				
9	¿Se han definido los indicadores (incluyendo sus unidades) y los mecanismos de verificación de los hitos y objetivos Críticos y No Críticos del Proyecto/Subproyecto?				
10	¿El coste estimado (cifras anuales) de la Medida ha sido distribuido entre los Proyectos/Subproyectos definidos?				
11	Si la Medida contribuye a la transición ecológica (climate tagging) y tiene asociado un único campo de intervención ¿se ha comprobado que el Proyecto/Subproyecto tiene asociado el campo de intervención?				
12	Si la Medida contribuye a la transición ecológica (climate tagging) y tiene asociado más de un campo de intervención ¿se ha asignado al Proyecto/Subproyecto la/s submedida/s que le corresponden?				
13	Si la Medida contribuye a la transición digital (digital tagging) y tiene asociado un único campo de intervención ¿se ha comprobado que el Proyecto/Subproyecto tiene asociado el campo de intervención?				
14	Si la Medida contribuye a la transición digital (digital tagging) y tiene asociado más de un campo de intervención ¿se ha asignado al Proyecto/Subproyecto la/s submedida/s que le corresponden?				
15	En caso de que para la ejecución del Proyecto sea necesario disponer de algún elemento que se obtiene al ejecutar otro Proyecto, ¿se ha detallado el Proyecto y el elemento del que se depende y en qué semestre se requiere su disponibilidad?				
16	¿La definición del Proyecto ha sido validada por Órgano responsable de la Medida en la que se integra? / ¿La definición del Subproyecto ha sido validada por Órgano gestor del Proyecto/Subproyecto en el que se integra?				
17	¿Se ha coordinado con la Autoridad responsable la definición del Proyecto/Subproyecto?				
18	¿Se ha cerrado en la herramienta informática la definición del Proyecto/Subproyecto?				

Hitos y objetivos CID

Descripción en la “parte blanca del CID”



Inversión 1 (C21.I1) - Creación de plazas del Primer Ciclo de Educación Infantil de titularidad pública (prioritariamente de 1 y 2 años).

En el marco de esta medida, España invertirá en la construcción de nuevas instalaciones de educación y cuidado de la primera infancia, la rehabilitación y renovación de edificios ya existentes y el equipamiento para la creación de al menos 60 000 nuevas plazas de titularidad pública para la educación y el cuidado infantil destinadas a niños y niñas menores de 3 años. La atención se centra en proporcionar plazas públicas asequibles para los niños y niñas que residan en zonas con mayor riesgo de pobreza o exclusión social y en zonas rurales, especialmente los de edades comprendidas entre 1 y 2 años. Los edificios serán propiedad de las Administraciones autonómicas o locales, o del Ministerio de Educación y Formación Profesional en el caso de Ceuta y Melilla.

También se espera que la inversión cubra los gastos de funcionamiento, incluidos los salarios de los profesores, durante el despliegue de la inversión para incentivar a las Administraciones Autonómicas y Locales a la creación de hasta 40 000 nuevas plazas escolares. España garantizará que la acción sea sostenible desde el punto de vista presupuestario una vez finalizado el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en particular recurriendo a otras fuentes de financiación de la UE.

La implementación de la medida estará terminada, a más tardar, el 31 de diciembre de 2024.

Hitos y objetivos CID

Componente e inversión

C21.I01.P01 – Promoción y nuevas plazas para el primer ciclo de educación infantil 0-3 años

Número	Medida	Hito/Objetivo	Nombre	Indicadores cualitativos (para los hitos)	Indicadores cuantitativos (para los objetivos)			Tiempo		Descripción de cada hito y objetivo
					Unidad	Base de referencia	Meta	Trimestre	Año	
308	C21.I1	Objetivo	Adjudicación de presupuesto para la promoción del primer ciclo de educación infantil		EUR	0	670 990 000	T4	2023	Adjudicación a las Entidades Autonómicas/Locales de un presupuesto de 670 990 000 EUR para la promoción del primer ciclo de educación infantil mediante la creación de nuevas plazas de titularidad pública.
309	C21.I1	Objetivo	Nuevas plazas para el primer ciclo de educación infantil	-	Número	0	60 000	T4	2024	Promoción del primer ciclo de educación infantil mediante la creación de nuevas plazas de titularidad pública (nueva construcción o reforma/rehabilitación y equipamiento en al menos 60 000 plazas en comparación con finales de 2020, y de estos gastos operativos hasta 40 000 plazas hasta 2024).

3. El sistema CoFFEE

Modulos

Plan de recuperación

Componentes

Medidas

Planificación y gestión

Proyectos

Subproyectos

Subproyectos instrumentales

Actuaciones

Carga de ficheros

Carga de proyectos

Carga de subproyectos

Carga de subproyectos instrumentales

Carga de actuaciones

Auditoría

Conflicto de interés

Accesos recientes

Placeholder for recent access cards

Enlaces de interes

- [SGFE](#)
- [Soporte CoFFEE](#)
- [O TR E Extranjeras](#)
- [Guía OM HFP/55/2023](#)

[← Volver a Subproyectos](#)

I1.P1.S10 Apoyo a ...

Datos generales

Submedidas asociadas

Objetivos climáticos y digitales

Recursos económicos

Hitos/Objetivos de gestión críticos

Hitos/Objetivos de gestión no críticos

Hitos auxiliares

Planificaciones

Progreso de indicadores

Actuaciones

Usuarios

Documentos anexos

Informes

Árbol de estructura

[Planificación y gestión](#) > [Subproyectos](#) > [Datos generales](#)

I1.P1.S10 Apoyo a aceleradoras culturales- COMUNITAT VALENCIANA

[Cancelar](#)

Proyecto en el que se integra *

C24.I01.P01 - Competitividad y profesionalización de las ICC

Localizador

C24.I01.P01.S03

Código Provisional *

C24.I01.P01.PROVISIONA

Nombre del subproyecto *

I1.P1.S10 Apoyo a aceleradoras culturales- COMUNITAT VALENCIANA

Fecha inicio *

4T/2021

Fecha fin *

4T/2023

Estado

REVISADO

Descripción *

Apoyo a aceleradoras culturales. Comunidad Valenciana



[← Volver a Subproyectos](#)

I1.P1.S10 Apoyo a ...



Datos generales

Submedidas asociadas

Objetivos climáticos y digitales

Recursos económicos

Hitos/Objetivos de gestión críticos

Hitos/Objetivos de gestión no críticos

Hitos auxiliares

Planificaciones

Progreso de indicadores

Actuaciones

Usuarios

Documentos anexos

Informes

Árbol de estructura

[🏠](#) > [Planificación y gestión](#) > [Subproyectos](#) > [Recursos económicos](#)



I1.P1.S10 Apoyo a aceleradoras culturales- COMUNITAT VALENCIANA

[✕ Cancelar](#)

Presupuesto previsto sin IVA

Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2024	Año 2025	Año 2026	Total
0,00 €	0,00 €	1.468.453,56 €	998.400,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.466.854,29 €

IVA del presupuesto previsto

Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2024	Año 2025	Año 2026	Total
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Presupuesto previsto total

Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2024	Año 2025	Año 2026	Total
0,00 €	0,00 €	1.468.453,56 €	998.400,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.466.854,29 €

Presupuesto aprobado sin IVA

Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2024	Año 2025	Año 2026	Total
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

IVA del presupuesto aprobado

Hitos y objetivos críticos

X Cancelar

Hito/objetivo crítico del proyecto/subproyecto padre *

C24.I01.P01.OBC02 - 354 - Reforzar la competitividad de las industrias...

Localizador

C24.I01.P01.S03.OBC01

Tipo

Objetivo

Fecha de cumplimiento planificada *

4T/2023

Nombre *

354 - Reforzar la competitividad de las industrias culturales

Estado

En curso

Fecha de cumplimiento real

Descripción del hito/objetivo *

Número de entidades y proyectos que reciben financiación del régimen de apoyo, para: - habilidades emprendedoras y financieras de los y las profesionales de los sectores de la cultura y la creación (al menos 900 entidades); - realización de la digitalización planificada y herramientas creadas para contribuir a la transformación digital (al menos 16 proyectos); - internacionalización de las industrias culturales y creativas (al menos 300 entidades). Los proyectos se ajustarán a la Guía técnica para la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p. 1) mediante el uso de una lista de exclusión y el requisito de cumplimiento de la legislación medioambiental nacional y de la UE pertinente. A la Comunidad Valenciana se le ha asignado un mínimo de 25

Observaciones

Indicadores

Valor logrado

Q Buscar en la tabla

Localizador	Tipo	Denominación	Valor base	Valor objetivo	Valor progreso acumulado	Valor logrado	Unidad de medida	Acciones
1		2						
IND001354	Cualitativo	Reforzar la competitividad de las industrias culturales	Pendiente de inicio	Finalizado	Pendiente de inicio	Pendiente de inicio	-	
IND001354a	Cuantitativo	Número de entidades y proyectos que reciben financiación del régimen de apoyo, para: - habilidades emprendedoras y financieras de los y las profesionales de los sectores de la cultura y la creación (al menos 900 entidades);	0,000	25,000	0,000	0,000	Entidades	

Mostrando de 1 a 2 de 2 resultados << < 1 > >>

Mecanismo de verificación *

Agregue un pie de página

Actuaciones

Q C24.I01.P01.S03








Nueva actuación

Localizador ↑↓ ∩	Código provisional ↑↓ ∩	Denominación ↑↓ ∩	Entidad Ejecutora ↑↓ ∩	Órgano Gestor ↑↓ ∩	Estado ↑↓ ∩	Clase de Actuación ↑↓ ∩	
	C24.I01.P01.S03.PROVISION AL.01	Apoyo a aceleradoras culturales. Comunitat Valenciana.	Generalitat Valenciana (A10044093) Vicepresidencia Primera y Conselleria de Cultura y Deporte	(A10045253) Subsecretaría - Vicepresidencia Primera y Conselleria de Cultura y Deporte	Borrador	Subvención	

Mostrando de 1 a 1 de 1 resultados << < 1 > >> 10 ⊖

En total hay 171 elementos.



CoFFEE | Mecanismo de Recuperación y ResilienciaNR001037

[← Volver a Actuaciones](#)

Apoyo a acelerador...

- Datos generales**
- Submedidas asociadas
- Objetivos climáticos y digitales
- Recursos económicos
- Hitos/Objetivos de gestión críticos
- Hitos/Objetivos de gestión no críticos
- Hitos auxiliares
- Progreso de indicadores
- Subvenciones asociadas
- Documentos anexos
- Árbol de estructura

Planificación y gestión > Actuaciones > Datos generales

Apoyo a aceleradoras culturales. Comunitat Valenciana.

[Borrar](#) [Cancelar](#) [Guardar](#)

Subproyecto *

C24.I01.P01.S03 - I1.P1.S10 Apoyo a aceleradoras culturales- COMUNITAT VALENCIANA

Localizador	Código provisional *	Fecha inicio *	Fecha fin *	Anualidad de planificación	Estado *
	C24.I01.P01.S03.PROVISIC	4T/2021	4T/2023	2021	Borrador

Clase de actuación *

Subvención

La actuación implica una transferencia de recursos económicos a otro Subproyecto del Plan *

Si

Nombre de la actuación *

Apoyo a aceleradoras culturales. Comunitat Valenciana.

Descripción *

Consulta subvencion

× Cancelar

Código BDNS *

URL Convocatoria

URL Concesion

555715

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/555715

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/concesiones/convocatoria/5

¿La fecha de publicación es posterior a la publicación de la OM HFP/55/2023, de 24 de enero? *

Código Operación

No



MRR\$k56gualpf45nYKig

Denominación *

Subvenciones previstas en el Plan de recuperación, transformación y resiliencia, para financiar la modernización y gestión sostenible de las infraestructuras de las artes escénicas y musicales de la Comunitat Valenciana

Aplicación presupuestaria

09.99.99.45199.7 linea S8608000

Fecha formalización

11/07/2022



Importe sin IVA

1.034.762,87 €

Importe total

1.034.762,87 €

Observaciones

AQUÍ SE CONTEMPLA SOLO LA CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN A ENTIDADES PRIVADAS

Consulta contrato

× Cancelar

Código contrato *

CMENOR/2021/06n03/897

¿La fecha de publicación del contrato es posterior a la publicación de la OM HFP/55/2023, de 24 de enero? *

No



Código Operación

MRR\$ihjwb1e2mitaHTqg

Denominación *

DIGITALIZACIÓN DE FONDOS DEL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ALICANTE DE LA MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA (Financiado por fondos europeos MRR)

Tipo contrato *

Servicios



Aplicación presupuestaria

99999241345199

Fecha formalización

14/12/2021



Importe sin IVA

12.393,80 €

Importe total

14.996,50 €

Observaciones

URL de la licitación

EJEMPLO: ENCOMIENDA DE GESTIÓN



Consulta encomienda

[Cancelar](#)

Código encomienda de gestión *

TRAGSATEC SERVICIOS OE CCCC EL CARMEN (COMUNITAT VALENCIANA)

¿La fecha de publicación es posterior a la publicación de la OM HFP/55/2023, de 24 de enero? *

No



Código Operación

Denominación

ENCOMIENDA DE GESTIÓN A TRAGSATEC PARA LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA DE EMERGENCIA EN LAS PANDAS NORTE Y OESTE DEL CLAUSTRO RENACENTISTA DEL CENTRO CULTURAL CCCC (Centre del Carme Cultura Contemporanea)

Aplicación presupuestaria

09.99.99.2412.451.99.6

Fecha formalización

15/11/2022



Importe sin IVA *

40.417,28 €

Importe total *

48.904,91 €

Observaciones

CON FECHA 17/05/2023 SE HA FIRMADO LA EXTENSIÓN DE IMPORTE DE LA EJECUCIÓN, LOS SERVICIOS Y EL PLAZO DE LA OBRA DE EMERGENCIA.

Documentos anexos

Tipo	Nombre documento	Datos personales	Creación	Acciones
Documento genérico	Bases reguladoras y convocatoria oferta cultural.pdf	Si	Usuario: NR001037 Fecha: 11/12/2023, 12:57:16	
Documento genérico	Concesión oferta cultural.pdf	Si	Usuario: NR001037 Fecha: 11/12/2023, 12:58:25	

Solicitudes de responsable de operación

Usuario solicitante	Usuario a perfilar	Cargo	Perfil solicitado	Fecha solicitud	Estado solicitud
No existen registros					
Mostrando de 0 a 0 de 0 resultados << < 1 > >>					

Beneficiarios



NIF	Nombre/Razón social	Importe sin IVA	Importe total	Dest. 2º Nivel	Acciones
B12935979	Produccions Metrònom SL	25.000,00 €	25.000,00 €	<input type="checkbox"/>	



Gracias

Subsecretaría
Servicio de Coordinación de Fondos Europeos

nextgenerationeu_edu@gva.es

<https://ceice.gva.es/va/next-generation-eu>

